




CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA
CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS

Informação de Abertura

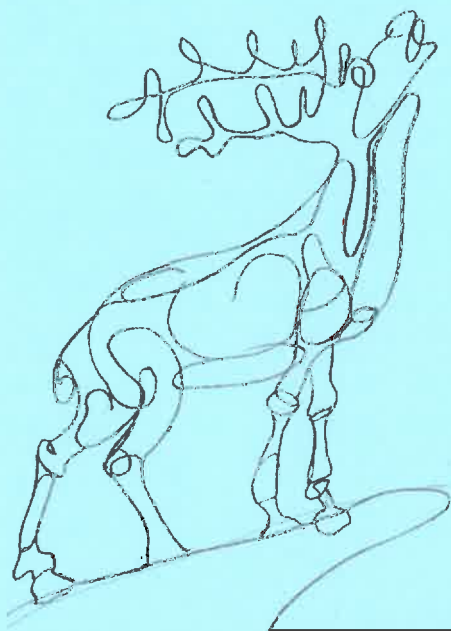

AJUSTE DIRETO

**Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Construção de Muro
na EM 515 e Construção de Estacionamento na Rua da Cheira, em Mentrestido**

Dados Gerais

Dados Gerais

Referência	AD-035-16
Designação	Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Construção de Muro na EM 515 e Construção de Estacionamento na Rua da Cheira, em Mentrestido
Descrição	Construção de Muro na EM 515 e Construção de Estacionamento na Rua da Cheira, em Mentrestido
Relacionado com outra pasta?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
ID	PT1.BDOS.7677349
Enquadramento Legal (Geral)	Código dos Contratos Públicos
Enquadramento Legal (Específico)	Código dos Contratos Públicos



Comprador:
Município de Vila Nova
de Cerveira

Classificação CPV

Vocabulário Principal - CPV 45200000-9 - Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil

Vocabulário Suplementar - CPV

Lista adicional de classificações

Classificação do Objecto

Tipo de Contrato Empreitada de Obras
Tipo de Objecto Execução
Duração do Contrato 60 Dia(s)

Local da Execução do Contrato

Mesma morada do Centro de Custo

Cabimentação

Nº do Cabimento 957/2016
Valor Cabimentado Valor Exacto Euro

Configurar Equipas e Fluxos do Procedimento

Este procedimento não requer a definição de fluxo de abertura.

Documentos Internos

Nenhum artigo encontrado.

Configurações

Identificação

Código de Categoria

Prazos

Fuso Horário (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
Data de Decisão de Contratar: 6 horas atrás (21-07-2016 10:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))
Data Limite de Recepção de Candidaturas/Propostas 11 Dias para terminar (01-08-2016 18:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))
Data de Abertura de Candidaturas/Propostas 11 Dias para terminar (02-08-2016 09:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))
Data Limite para Esclarecimentos
Data Limite para Erros e Omissões
Data e hora da publicação na plataforma 21-07-2016 16:50:10 ((UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))
Prazo de validade das candidaturas / propostas 66 Dia(s)

Visitas ao local de execução do contrato

Permite visitas ao local de execução do contrato? Sim Não
Data Limite para visitas:
Informação Adicional:

Lotes

Definir Lotes Sim Não *

Limitação de Preços

Definir preço base? Sim Não
Preço Base 36.100,00 Euro
Utilizar valores da Lista de Preços
Definir preço mínimo? Sim Não

Negociação e Leilão Electrónico

O procedimento será objecto de negociação? Sim Não

Configurações Avançadas

Questionário

1 Questionário

1.1 Articulado da Consulta

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Preço Total
0,00

Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1		TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1.1		Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	1	VG		
1.2		Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.	1	VG		
2		MURO NA EM 515				
2.1		Levantamento de pavimento betuminoso existente danificado, incluindo transporte a vazadouro.	123,2	M2		
2.2		Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do muro, através de meios mecânicos, incluindo transporte a vazadouro das terras sobranes.	210	M3		
2.3		Construção de muro de suporte em betão ciclópico, entre o existente e a plataforma da estrada, incluindo fornecimento de todos os materiais, cofragens e mão-de-obra necessários à correta execução dos trabalhos.	210	M3		
2.4		Fornecimento e colocação de camada de base em tout-venant com 15cm de espessura, incluindo a respetiva compactação mecânica.	123,2	M2		
2.5		Construção de valeta em betão com 10cm de espessura, com colocação de malhassol, incluindo todos os trabalhos preparatórios e necessários à correta execução da tarefa.	56	M2		
2.6		Fornecimento e aplicação de pavimento betuminoso de desgaste com 7cm de espessura, incluindo rega de impregnação e fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos trabalhos.	123,2	M2		
2.7		Pintura horizontal na via, incluindo linha contínua da berma e linha descontinua do eixo do CM.	112	ML		
3		ESTACIONAMENTO NA RUA DA CHEIRA				
3.1		Levantamento de lancis em betão existentes e transporte a depósito a indicar pela fiscalização.	1	VG		
3.2		Escavação para abertura de caixa em terreno de qualquer natureza, incluindo transporte dos produtos sobranes a vazadouro.	280	M2		
3.3		Fornecimento e colocação de camada de base em tout-venant com 15cm de espessura, incluindo a respetiva compactação mecânica.	280	M2		
3.4		Fornecimento e colocação de lancil de betão com 12cm, incluindo fundação em betão, nos parques na interceção das serventias.	30	ML		
3.5		Construção de ensoleiramento em betão para base do contentor de resíduos de vidro, incluindo todos os trabalhos e materiais associados.	1	VG		
3.6		Execução de reforço de muro em blocos existente, em betão ciclópico com altura até à cota da fundação em tout-venant, incluindo todos os materiais e mão-de-obra para a correta execução dos trabalhos.	40	ML		
3.7		Recolocação de caixas de contadores existentes, incluindo respetivas ligações.	2	UN		
3.8		Levantamento de caixas existentes para a nova cota do pavimento em cubo, incluindo todos os trabalhos e materiais associados.	3	UN		
3.9		Demolição e reconstrução de sarjetas de águas pluviais, com reaproveitamento da grelha existente, incluindo ligação à linha de águas pluviais.	3	UN		
3.10		Fornecimento e assentamento de cubo azul 11x11cm, incluindo o fornecimento e aplicação de areia para assentamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a uma perfeita execução.	280	M2		
4		DIVERSOS				
4.1		Construção de caixa de visita com o fornecimento do cone e lampa pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos e materiais associados.	3	UN		
4.2		Subir caixa existente para a cota do passeio, incluindo todos os trabalhos e materiais associados.	1	UN		
4.3		Demolição de bordadura existente no local a construir o passeio, bem como escavação da caixa na zona do passeio em terra e selagem de todas as saídas de água existente, incluindo todos os trabalhos e materiais associados.	1	VG		
4.4		Fornecimento e execução de fundação em tout-venant com 12cm de espessura na zona a construir o passeio, bem como o enchimento de tout-venant na zona rebaixada existente.	170	M2		
4.5		Fornecimento e colocação de lancil em betão de 1x0,08x0,02m facetados e boleados na aresta exterior assente sobre fundação em betão.	123	ML		
4.6		Construção de passeio em betonilha esquadrelada com 6 cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais associados.	170	M2		

Avaliação

Definições

O procedimento tem modelo de avaliação? Sim Não *

Peças do Procedimento

Observações Adicionais

Documentos

Nome	Descrição	É público?	Assinaturas
<input type="checkbox"/> Caderno de Encargos_AD-035-16_Assinado.pdf	Caderno de Encargos_AD-035-16_Assinado.pdf	Sim	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Convite_AD-035-16_Assinado.pdf	Convite_AD-035-16_Assinado.pdf	Sim	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Mapa de Quantidades_AD-035-16.zip	Mapa de Quantidades_AD-035-16.zip	Sim	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Plano de Segurança e Saude_AD-035-16.zip	Plano de Segurança e Saude_AD-035-16.zip	Sim	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> PPGRCD_AD-035-16_Assinado.pdf	PPGRCD_AD-035-16_Assinado.pdf	Sim	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Projeto_AD-035-16.zip	Projeto_AD-035-16.zip	Sim	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Declaração_FEsmeriz_Formalizador-Gestor_Assinado.pdf	Declaração_FEsmeriz_Formalizador-Gestor_Assinado.pdf	Sim	Abrir Detalhe

Documentos da Proposta / Habilitação

Lista de Documentos Solicitados

Tem ao seu dispor uma lista de documentos administrativos que pode solicitar aos seus Fornecedores. Selecciona os documentos que pretende solicitar. Se pretender algum documento que não esteja contemplado na lista apresentada, poderá adicioná-lo no final, seleccionando a opção Requer Outro Tipo de Documentos.

Filtrar por Tipo

<u>Documento Administrativo</u>	<u>Na habilitação</u>	<u>Na proposta</u>
Declaração de habilitação (Artigo 81.º/n.º 1/al. a) do CCP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos ao estado Português.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão ou fotocópia autenticada da situação contributiva para com a Segurança Social se encontra regularizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Registo Criminal dos representantes da empresa, conforme as alíneas b) e i) do artigo 55.º do CCP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão de registo comercial ou disponibilização do código de acesso para a sua consulta on-line, nos termos previstos no nº 2 do artigo 83º do CCP, nº 5 do artigo 75º do Código do Registo Comercial e no artigo 17º da Portaria nº 1416-A/2006, de 19 de Dezembro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de inscrição em lista oficial de fornecedores que revele a titularidade das habilitações adequadas necessárias à execução das prestações objecto do contrato a celebrar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de inscrição no Registo Nacional de Pessoas colectivas, com todas as inscrições em vigor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo da declaração periódica de rendimentos (Modelo 22)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaração relativa a rendimentos e retenções de residentes (Modelo 10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo Q da informação simplificada (IES) relativamente ao último exercício económico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Procuração de delegação de poderes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma da Madeira.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma dos Açores.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Anexo I - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
✓ Anexo II - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo IV - Declaração a que se refere a alínea i) do n.º 1 e o n.º 4 do artigo 164.º e o n.º 2 do artigo 165.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo V - Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º) - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo VI - Declaração bancária a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 179.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Requer outro tipo de documentos

Sim Não

Provedores

Deseja que a plataforma Sim Não
 lhe sugira para convite as
 empresas inscritas na
 categoria do
 procedimento?

Fornecedor (1)	Contactos	Primeira/Última Vista	Convite Directo (1)	Interessados (0)	Respondido (0)
 PRIMUS LEAN - Engenharia & Construção, Lda. PORTUGAL Viana do Castelo Empreiteiros Gerais NIF: 509538231	SMS: 258735125 Fax: 258735125 e-mail: geral@primus-lean.pt		Yes	-	-



Município de Vila Nova de Cerveira
Câmara Municipal

Contratação Pública e Financiamentos

AJUSTE DIRETO – BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL – CONSTRUÇÃO DE MURO NA EM 515 E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA RUA DA CHEIRA, EM MENTRESTIDO

DESPACHO

No uso da competência atribuída no n.º 2 do artigo 18 do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, conjugado com a alínea f) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, bem como para cumprimento do disposto nos artigos 36.º, 38.º e n.º 2 do artigo 40.º, todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, aprovo o proposto na Informação de abertura respeitante ao procedimento por Ajuste Direto supra identificado.

Proceda-se à abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 21 de julho de 2016

O Presidente da Câmara,


João Fernando Brito Nogueira



Município de Vila Nova de Cerveira
Câmara Municipal

Contratação Pública e Financiamentos

INFORMAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

AJUSTE DIRETO – BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL – CONSTRUÇÃO DE MURO NA EM 515 E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA RUA DA CHEIRA, EM MENTRESTIDO

1. Face à informação prestada através da aplicação MEDIDATA com o registo n.º 1620/2016 (documentos em anexo) torna-se necessário abrir o respetivo procedimento da empreitada em epígrafe.

2. Para os efeitos de prévia cativação da despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder **€ 36.100,00 (trinta e seis mil e cem euros)**, ao qual acresce o valor de IVA à taxa legal em vigor, a satisfazer pela dotação da rubrica orçamental: **03/07010408 (Divisão de Serviços Municipais – Aquisição de Bens de Capital – Investimentos – Construções Diversas – Viação Rural) [2005 – I – 61]**.

3. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento prevista no artigo 18.º do Código dos Contratos Públicos (**doravante designado abreviadamente por CCP**) aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação e do valor máximo do benefício económico que pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução do contrato a celebrar de acordo com os limites ao valor do contrato constantes da alínea a) do artigo 19.º do CCP, propõe-se a adoção de um procedimento por **Ajuste Direto**.

4. O Caderno de Encargos da empreitada em epígrafe não é acompanhado pelo Programa, uma vez que tal não se revela necessário, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do Anexo I da portaria 701-H/2008, de 29 de julho. Tratando-se de um contrato de empreitada de obras públicas de complexidade técnica muito reduzida dispensa-se a apresentação do referido documento.

5. Critério de adjudicação: **O do mais baixo preço**.

6. Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (**CPV**) - Vocabulário Principal – **45200000-9** (Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil).

7. Relativamente à tramitação procedimental, propõe-se que seja convidada a seguinte empresa:

PRIMUS LEAN – Engenharia & Construção, Lda.

Parque Empresarial de Lanheses Fração 7C, Lote 7

4925-424 Viana do Castelo, Portugal

Telf.: 258 735 125 – Fax: 258 735 125

Correio eletrónico: geral@primus-lean.pt

NIPC: 509 538 231



Município de Vila Nova de Cerveira
Câmara Municipal

Contratação Pública e Financiamentos

8. Para a fiscalização da empreitada propõe-se a designação do seguinte Técnico:


- Nuno José Correia de Freitas Couto Esteves.

9. Para o presente procedimento propõe-se como peças o Convite e o Caderno de Encargos acompanhado pelo Projeto de Execução.

Face ao exposto e para cumprimento do disposto no CCP, nomeadamente o estipulado nos artigos 36.º, 38.º e n.º 2 do artigo 40.º, submete-se à consideração superior a presente proposta de decisão de contratar, bem como a autorização para abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 21 de julho de 2016

O Técnico Superior,



Francisco José Rodrigues Esmeriz

IMPRESSO	PAGINA
2016/06/21	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
003	mcastro	2016/06/21	957	2016

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Empreitada de "Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal - Construção de Muro na EM 515 e Construção de Estacionamento na Rua da Cheira, em Mentrestido"

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

TIPO DESP: 2501-VIAÇÃO RURAL (EM CURSO)
ORGÂNICA : 03 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
ECONÔMICA: 07010408 Viação rural
PLANO : 2005 I 61
Rede viária e sinalização
Beneficiação e conservação da rede viária municipal

DOTAÇÃO DISPONÍVEL
282.796,37
A CABIMENTAR
38.266,00
SALDO APÓS CABIMENTO
244.530,37

EXTENSO

TRINTA E OITO MIL DUZENTOS E SESENTA E SEIS EUROS

SERVIÇO REQUISITANTE

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2016/06/21

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADO POR COMPUTADOR



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

DESPACHO:

Ao Serviço de Aprovisionamento para que, de acordo com a informação prestada pelo Serviço de Finanças, procedam à emissão da respetiva cabimentação.

aoliveir
15-06-2016

Visto
20-06-2016

EMITIDA PROPOSTA DE CABIMENTO N.º 957/2016 NO
VALOR DE 38.266,00 EUROS COM IVA INCLUIDO

mcastro
21-06-2016

O presente procedimento deve ser encaminhado
para a Eng. Cristiana.

aoliveir
21-06-2016

No que respeita à presente empreitada foi elaborado o respetivo processo físico (informação de abertura e peças do procedimento) e procedeu-se à abertura do respetivo procedimento de acordo com a deliberação do órgão competente para a decisão de contratar. Face ao exposto, o presente processo pode ser arquivado.

21-07-2016

Isabel Maria de Castro Branco



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

INFORMAÇÃO INTERNA

Despacho:

Para informar sobre a disponibilidade de fundos a fim de se poder iniciar o procedimento de contratação

06-06-2016

Concordo.

Iniciar o processo de contratação

14-06-2016

De: SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS Para: EXPEDIENTE GERAL
Cristiana Maria de Castro Brandão João Fernando Brito Nogueira

ASSUNTO: 1530/2016 - Empreitada de "Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Construção de Muro na EM 515 e Construção de Estacionamento na Rua da Cheira, em Mentrestido"

A presente obra está contemplada no plano de atividades do ano de 2016 através da rubrica orçamental 2005-I-61.

Trata-se de trabalhos de construção de um muro de suporte na EM 515 em frente à Capela Mortuária de Mentrestido que visam corrigir o abatimento da estrada municipal. A proposta contempla ainda a construção de lugares de estacionamento na Rua da Cheira levando a efeito a pavimentação de uma sobre-largura em cubo de granito.

Foi solicitada uma proposta de preços à empresa Primus Lean – Engenharia & Construção, Lda..

Os preços apresentados revelam-se adequados face a natureza e extensão dos trabalhos a executar, pelo que proponho a adoção de um preço base de 36.100,00 €, tendo em conta a proposta de preço apresentada. Propõem-se ainda um prazo de execução da obra de 60 dias.

Em consequência do descrito acima, solicito autorização superior para a abertura de um procedimento de contratação pública por ajuste direto para a realização da empreitada à empresa Primus Lean – Engenharia & Construção, Lda.. Caso o Sr. Presidente concorde deveria circular o presente processo para os Serviços de Contabilidade para informarem se existem fundos disponíveis para assumir o compromisso e consequentemente efetuarem a respetiva cabimentação. Posteriormente, caso a informação seja favorável, deverá remeter o processo ao Serviço de Contratação Pública e Financiamentos para abertura do respetivo procedimento.

Vila Nova de Cerveira, 3 de JUNHO, de 2016

Cristiana Maria de Castro Brandão

Atendendo que existem fundos disponíveis e dotação orçamental, poder-se-á assumir o compromisso.

caraujo

13-06-2016

Empreitada: "Construção de Muro na EM em frente à Capela Mortuária, Mentrestido - V.N. Cerveira"

Ao:
Município de Vila Nova de Cerveira
Praça do Município
4920-284 Vila Nova de Cerveira

Lanheses, 24 de Maio de 2016

Assunto: Proposta "Construção de Muro na EM em frente à Capela Mortuária, Mentrestido - V.N. Cerveira"

A firma PRIMUS LEAN – Engenharia & Construção, Lda., com o número de identificação de pessoa colectiva N.º 509 538 231, com sede no Parque Empresarial de Lanheses, Fracção 7C, Lote 7, Freguesia de Lanheses, Concelho de Viana do Castelo, titular do Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas IMPIC N.º 65593-PUB, conforme solicitado, vimos muito respeitosamente apresentar a vossa excelência a nossa melhor proposta para a execução da empreitada de "Construção de Muro na EM em frente à Capela Mortuária, Mentrestido - V.N. Cerveira", conforme Mapa de Quantidades apenso a esta proposta pelo valor de **21.469,52€ (Vinte e Um Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Euros e Cinquenta e Dois Cêntimos)**, que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado.

À quantia supramencionada acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.

Com os melhores cumprimentos,

Atentamente,



Página 1 de 1



LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Artigo	DESIGNAÇÃO	QUANT.	UN	PREÇOS		
				UNITÁRIOS	PARCIAIS	TOTAIS
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS					
1.1	Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	1,00	Vg.	350,00 €	350,00 €	
1.2	Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e demolição.	1,00	Vg.	250,00 €	250,00 €	600,00 €
2	MURO					
2.1	Levantamento de pavimento betuminoso existente danificado, incluindo transporte a vazadouro.	123,20	m2	4,75 €	585,20 €	
2.2	Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do muro, através de meios mecânicos, incluindo transporte a vazadouro das terras sobrantes.	210,00	m3	5,00 €	1.050,00 €	
2.3	Construção de muro de suporte em betão ciclópico, entre o existente e a plataforma da estrada, incluindo fornecimento de todos os materiais, cofragens e mão-de-obra necessários à correcta execução dos trabalhos.	210,00	m3	75,00 €	15.750,00 €	
2.4	Fornecimento e colocação de camada de base em tout-venant com 15cm de espessura incluindo a respectiva compactação mecânica.	123,20	m2	3,85 €	474,32 €	
2.5	Construção de valeta em betão com 10cm de espessura, com colocação de malhassol, incluindo todos os trabalhos preparatórios e necessários à correcta execução da tarefa.	56,00	m2	15,75 €	882,00 €	
2.6	Fornecimento e aplicação de pavimento betuminoso de desgaste com 7cm de espessura incluindo rega de impregnação e fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos trabalhos.	123,20	m2	12,50 €	1.540,00 €	
2.7	Pintura horizontal na via, incluindo linha contínua da berma e linha descontínua do eixo do CM.	112,00	mL	5,25 €	588,00 €	20.869,52 €
Valor Total da Empreitada						21.469,52 €

Ao total da empreitada acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.

Empreitada: "Pavimentação de sobre-largura e Drenagens na Rua da Cheira em Mentrestido - VNCerveira"

Ao:
Município de Vila Nova de Cerveira
Praça do Município
4920-284 Vila Nova de Cerveira

Lanheses, 24 de Maio de 2016

Assunto: Proposta "*Pavimentação de sobre-largura e Drenagens na Rua da Cheira em Mentrestido - VNCerveira*"

A firma PRIMUS LEAN – Engenharia & Construção, Lda., com o número de identificação de pessoa colectiva N.º 509 538 231, com sede no Parque Empresarial de Lanheses, Fracção 7C, Lote 7, Freguesia de Lanheses, Concelho de Viana do Castelo, titular do Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas IMPIC N.º 65593-PUB, conforme solicitado, vimos muito respeitosamente apresentar a vossa excelência a nossa melhor proposta para a execução da empreitada de "**Pavimentação de sobre-largura e Drenagens na Rua da Cheira em Mentrestido - VNCerveira**", conforme Mapa de Quantidades apenso a esta proposta pelo valor de **9.974,00€ (Nove Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Euros)**, que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado.

À quantia supramencionada acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.

Com os melhores cumprimentos,

Atentamente,



PRIMUS LEAN
— ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO —

Página 1 de 1



Entidade: Município de Vila Nova de Cerveira

REF. nº: 053 / 2016

Emp: "Pavimentação de sobre-largura e Drenagens na Rua da Cheira em Mentrestido - VNCerveira"

DATA: 24-05-2016

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Artigo	DESIGNAÇÃO	QUANT.	UN	PREÇOS	
				UNITÁRIOS	PARCIAIS
				TOTAIS	
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1.1	Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	1,00	vg	350,00 €	350,00 €
1.2	Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e demolição.	1,00	vg	250,00 €	250,00 €
					600,00 €
2	RUA DA CHEIRA				
2.1	Levantamento de lancis em betão existentes, e transporte a depósito a indicar pela fiscalização.	1,00	vg	300,00 €	300,00 €
2.2	Escavação para abertura de caixa em terreno de qualquer natureza, incluindo transporte dos produtos sobranes a vazadouro.	280,00	m2	3,00 €	840,00 €
2.3	Fornecimento e colocação de camada de base em tout-venant com 15cm de espessura incluindo a respectiva compactação mecânica.	280,00	m2	3,85 €	1.078,00 €
2.4	Fornecimento e colocação de lancil de betão c/ 12cm, incluindo fundação em betão, nos parques na intercepção das serventias.	30,00	mL	14,00 €	420,00 €
2.5	Construção de ensoleiramento em betão para base ao contentor de resíduos de vidro.	1,00	vg	250,00 €	250,00 €
2.6	Execução de reforço de muro em blocos existente, em betão ciclópico com altura até à cota da fundação em tout-venant incluindo todos os materiais e mão-de-obra para a correcta execução dos trabalhos.	40,00	ml	30,00 €	1.200,00 €
2.7	Recolocação de caixas de contadores existentes, incluindo respectivas ligações.	2,00	un	125,00 €	250,00 €
2.8	Levantamento de caixas existentes, para a nova cota do pavimento em cubo.	3,00	un	75,00 €	225,00 €
2.9	Demolição e reconstrução de sarjetas de águas pluviais, com reaproveitamento da grelha existente, incluindo ligação à linha de águas pluviais.	3,00	un	115,00 €	345,00 €
2.10	Fornecimento e assentamento de cubo azul 11X11, incluindo o fornecimento e aplicação de areia para assentamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a uma perfeita execução.	280,00	m2	15,95 €	4.466,00 €
					9.374,00 €
Valor Total da Empreitada					9.974,00 €

Ao total da empreitada acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.



PRIMUSLEAN
ENGENHARIA & CONSULTORIA

Entidade: Município de Vila Nova de Cerveira

REF. #: 078\2015

Emp: "Construção de passeios no exterior das Piscinas Municipais."

DATA: 29-09-2015

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Artigo	DESIGNAÇÃO	QUANT.	UN	PREÇOS		
				UNITÁRIOS	PARCIAIS	TOTAIS
TRABALHOS						
1	Construção de caixa de visita com o fornecimento do cone e tampa pela Camara sendo todo o resto do material necessário, mão-de-obra, escavação e fundo de caixa guiada da nossa responsabilidade.	3,00	un	165,00 €	495,00 €	
2	Subir caixa existente para a cota do passeio	1,00	un	25,00 €	25,00 €	
3	Demolição de bordadura existente no local a construir o passeio bem como escavação da caixa na zona do passeio em terra e selagem de todas as saídas de água existente.	1,00	vg	350,00 €	350,00 €	
4	Fundação em tout venant com 12 cm de espessura na zona a construir o passeio bem como o enchimento de tout venant na zona rebaixada existente.	170,00	m2	2,90 €	493,00 €	
5	Fornecimento e colocação de lancil em betão de 1 x 0.08 x 0.02 metros facetados e boleado na aresta exterior assente sobre fundação em betão.	85,00	ml	11,90 €	1.011,50 €	
6	Construção de passeio em betonilha esquartelada com 6 cm de espessura.	170,00	m2	13,00 €	2.210,00 €	4.584,50 €
Valor Total da Empreitada					4.584,50 €	

Ao total da empreitada acresce o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.

- Fornecimento e colocação de
lancil, na rua de Acesso ao
terreno - $38 \times 11,90 \text{ €} = 450,00 \text{ €}$

PRIMUSLEAN
ENGENHARIA & CONSULTORIA
